


【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】


| |
|--|
| 事業番号 D-14-1 |
| 事業名 造成宅地滑動崩落緊急対策事業 |
| 事業費 総額 123,111 千円 (国費 102,592 千円) (内訳: 工事費 103,204 千円、委託料 16,339 千円、補償費 3,568 千円) |
| 事業期間 平成 24 年度～平成 26 年度 |
| <p>事業目的</p> <p>東北地方太平洋沖地震により、地盤の滑動崩落等で被害を受けた造成宅地の復旧及び地域防災計画に記載されている避難地(広野町役場)等への二次災害を防止するため、滑動崩落防止対策工事を緊急に行うことを目的とする。</p> <p>(事業地区: 広野町大字下北迫字苗代替地区)</p> |
| <p>事業結果</p> <p>地盤改良工(深層混合処理工(φ800 H=4.0~10.0m)) 943 本 排水ボーリング工 218.8m、暗渠排水工 149.5m、プレキャストL型擁壁工 92m</p> |
| <p>事業の実績に関する評価</p> <p>① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 地盤の滑動崩落等で被害を受けた造成宅地の滑動崩落防止対策工事を緊急に行うことにより、住民の安全が確保され、不安解消となり帰還へと繋がったと考えられる。</p> <p>② コストに関する調査・分析・評価 事業費については、業務の受注者を競争入札により選定しており、妥当であると考えられる。</p> <p>③ 事業手法に関する調査・分析・評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画 平成 24 年度 測量設計 平成 25 年度 対策工事 ・実績 平成 24 年度 測量設計 平成 25 年度～平成 26 年度 対策工事 <p>当初は平成 25 年度内の完成を目標としていたが、民地内の構造物復旧に際し、所有者の立会い及び承諾が必要であるが、所有者が遠方であり、日程調整等に時間を要したものの、所有者の協力等により期間延伸を最小限にとどめた。</p> |
| <p>事業担当部局</p> <p>広野町復興企画課 電話番号: 0240-27-1251</p> |

位置図・平面図

位置図(造成宅地滑動崩落緊急対策工事)

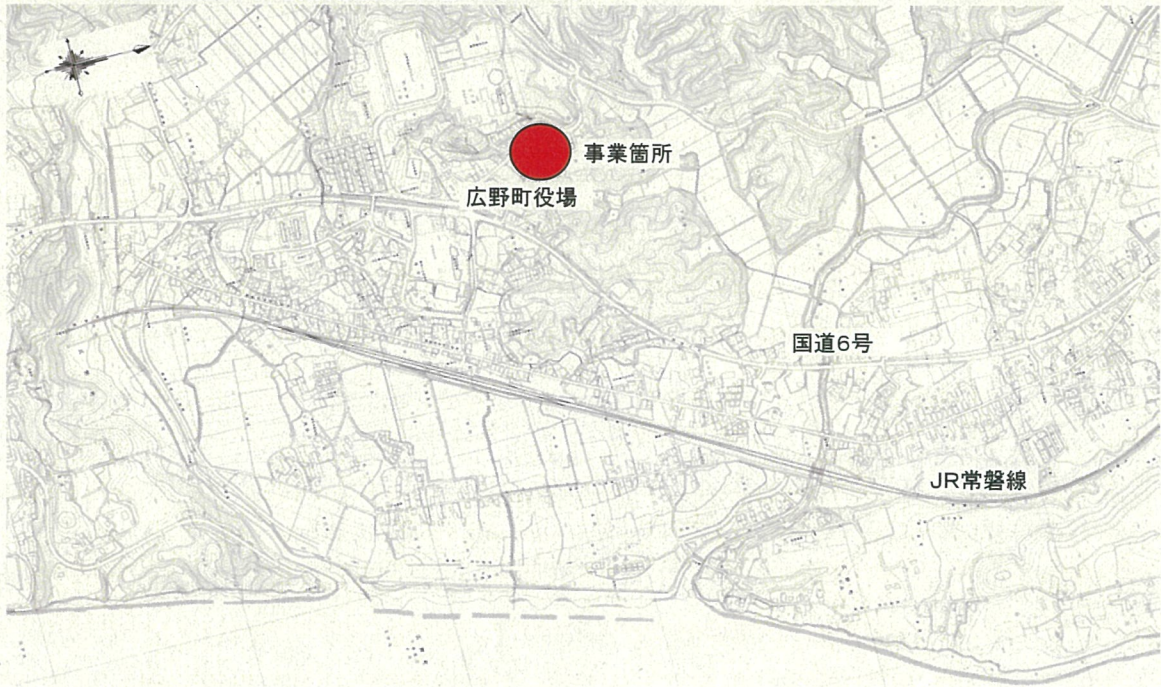

平面図(造成宅地滑動崩落緊急対策工事)

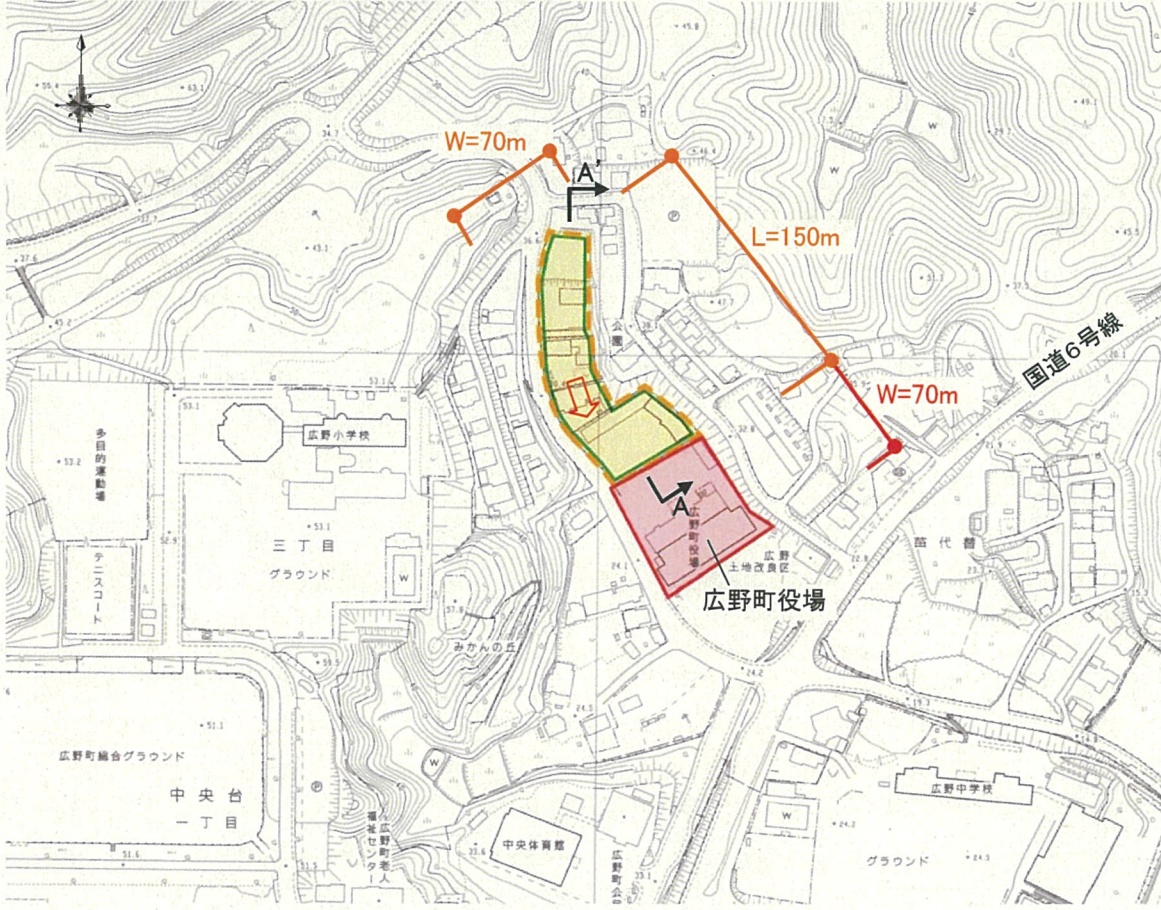

- 盛土区域
- 造成宅地防災区域
- 影響範囲

工事施工前



| | |
|---------------|---|
| 平成 25年 4月 30日 | 測点 Aブロック(東側から) |
| 工事概要 | 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水樹工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 |

施工前



| | |
|---------------|---|
| 平成 25年 4月 30日 | 測点 Aブロック(西側から) |
| 工事概要 | 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水樹工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 |

施工前

竣工写真



| | |
|---|----------------|
| 平成 26年 5月 20日 | 測点 Aブロック(東側から) |
| 工事概要 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水柵工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 | 竣工 |



| | |
|---|----------------|
| 平成 26年 5月 20日 | 測点 Aブロック(西側から) |
| 工事概要 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水柵工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 | 竣工 |

工事施工前



| | |
|---------------|---|
| 平成 25年 4月 30日 | 測点 Bブロック(東側から) |
| 工事概要 | 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水柵工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 |


施工前



| | |
|---------------|---|
| 平成 25年 4月 30日 | 測点 Bブロック(西側から) |
| 工事概要 | 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水柵工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 |

施工前

竣工写真

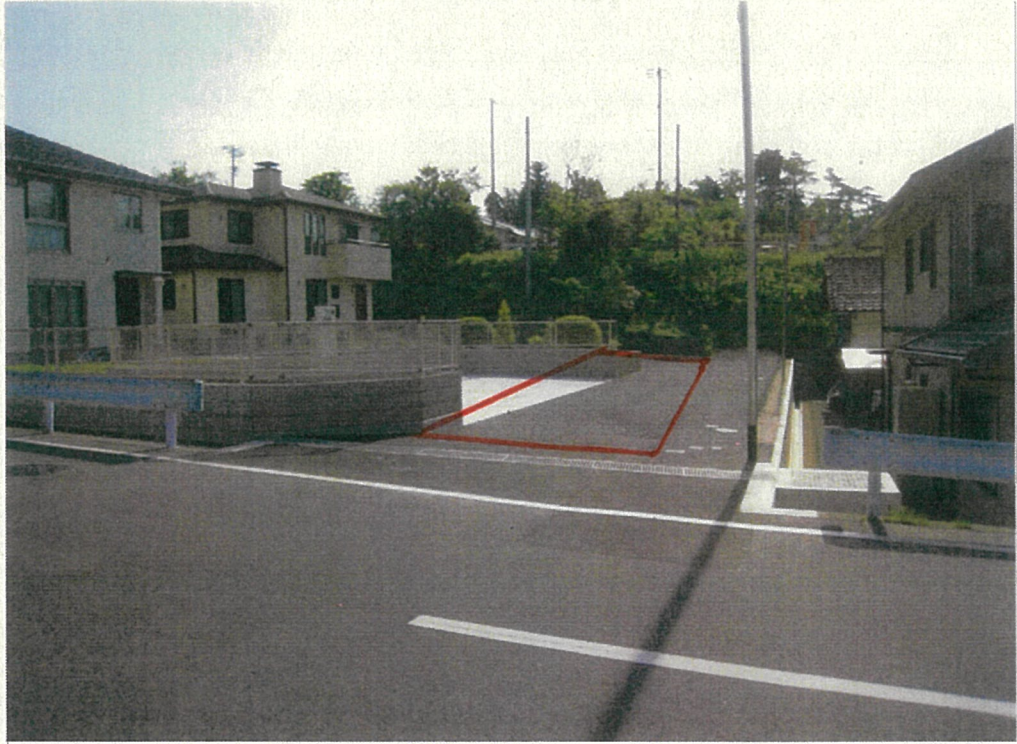

| | |
|--|----------------|
| 平成 26年 5月 20日 | 測点 Bブロック(東側から) |
| 工事概要 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水柵工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 | 竣工 |



| | |
|--|----------------|
| 平成 26年 5月 20日 | 測点 Bブロック(西側から) |
| 工事概要 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水柵工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 | 竣工 |

工事施工前



| | |
|---------------|---|
| 平成 25年 4月 30日 | 測点 Cブロック(東側から) |
| 工事概要 | 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水柵工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 |

施工前



| | |
|---------------|---|
| 平成 25年 4月 30日 | 測点 Cブロック(西側から) |
| 工事概要 | 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水柵工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 |

施工前

竣工写真



| | |
|--|----------------|
| 平成 26年 5月 20日 | 測点 Cブロック(東側から) |
| 工事概要 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水樹工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 | 竣工 |



| | |
|--|----------------|
| 平成 26年 5月 20日 | 測点 Cブロック(西側から) |
| 工事概要 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水樹工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 | 竣工 |

工事施工前



| | |
|---------------|---|
| 平成 25年 4月 30日 | 測点 Dブロック(東側から) |
| 工事概要 | 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水樹工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 |

施工前



| | |
|---------------|---|
| 平成 25年 4月 30日 | 測点 町道部(南側から①) |
| 工事概要 | 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水樹工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 |

施工前

竣工写真



| | |
|---------------|---|
| 平成 26年 5月 20日 | 測点 Dブロック(東側から) |
| 工事概要 | 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水柵工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 |
| | 竣工 |



| | |
|---------------|---|
| 平成 26年 5月 20日 | 測点 町道部(南側から①) |
| 工事概要 | 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水柵工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 |
| | 竣工 |

工事施工前



平成 25年 4月 30日 | 測点 町道部(南側から②)

工事概要 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水樹工 1.0式
 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 施工前
 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式



平成 25年 4月 30日 | 測点 町道部(北側から)

工事概要 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水樹工 1.0式
 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 施工前
 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式

竣工写真



| | |
|--|---------------|
| 平成 26年 5月 20日 | 測点 町道部(南側から②) |
| 工事概要 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水樹工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 | 竣工 |



| | |
|--|--------------|
| 平成 26年 5月 20日 | 測点 町道部(北側から) |
| 工事概要 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水樹工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 | 竣工 |

工事施工前



| | |
|--|---------------|
| 平成 25年 4月 30日 | 測点 駐車場部(東側から) |
| 工事概要 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水樹工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 | 施工前 |



| | |
|--|---------------|
| 平成 25年 4月 30日 | 測点 駐車場部(西側から) |
| 工事概要 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水樹工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 | 施工前 |

竣工写真



| | |
|--|---------------|
| 平成 26年 5月 20日 | 測点 駐車場部(東側から) |
| 工事概要 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水樹工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 | 竣工 |



| | |
|--|---------------|
| 平成 26年 5月 20日 | 測点 駐車場部(西側から) |
| 工事概要 深層混合処理工 1.0式 作業土工 1.0式 排水工 1.0式 集水樹工 1.0式 側溝工 1.0式 集排水ボーリング工 1.0式 L型擁壁工 1.0式 工作物復旧工 1.0式 給排水設備撤去・復旧工 1.0式 構造物取壊し 1.0式 | 竣工 |
