
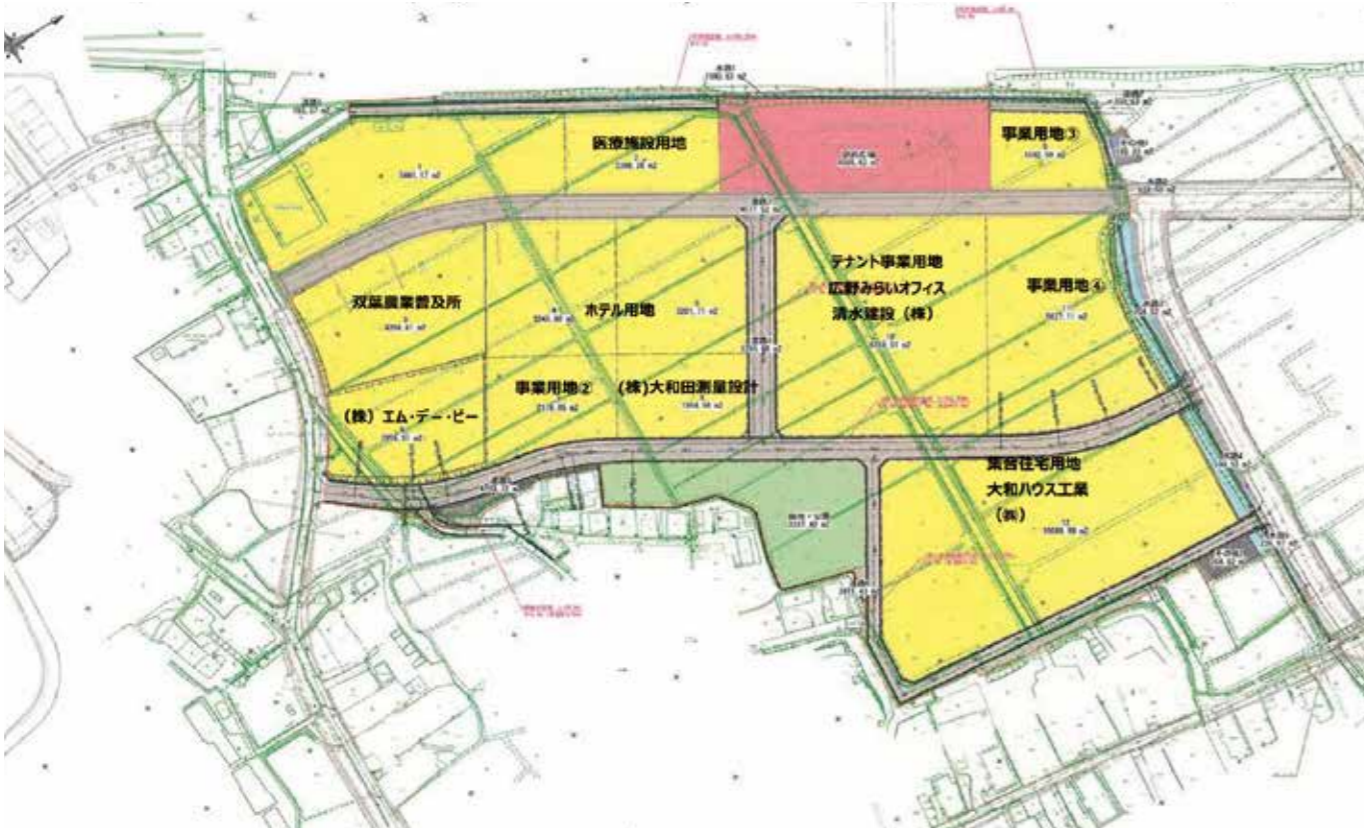


～ 写真で見る町の復興・再生の様子 ～

広野町復興事業進捗状況一覧表

(平成29年3月31日現在)

番号	事業名	事業概要	28年度末状況	進捗率 (%)
①	広野駅東側開発整備事業(第1期)	造成工 64,212㎡ 配水管布設工 長さ 1,410.8m 污水管布設 長さ 1,491.7m	造成工 64,212㎡ 配水管布設工 長さ 1,410.8m 污水管布設 長さ 1,491.7m	100
②	広野駅東側開発整備事業(第2期)	開発面積 6.90ha	未着手	0
③	町道本町～宮田線	長さ 850.6m、 幅 4.0 (5.0) m	長さ 700m	70.0
④	町道久保田1号線	長さ 501.0m、 幅 5.5 (9.0) m	長さ 501.0m (ご道橋 長さ 27.8m)	74.0
⑤	町道浜田線	長さ 183.5m、 幅 4.0 (5.0) m	未着手	0
⑥	広野駅自由通路	長さ 38.4m、 幅 3.0m	長さ 38.4m、 幅 3.0m	100.0
⑦	町道下浅見川線	①長さ 416.7m、 ②長さ 227.5m、 幅 5.5 (8.75) m ③橋梁 長さ 49.4m	①長さ 416.7m、 ②長さ 227.5m、 幅 5.5 (8.75) m ③橋梁 長さ 49.4m	100.0
⑧	町道広長～久保田線	長さ 1,015m、 幅 5.5 (9.0) m	長さ 397.2m	39.1
⑨	町道折返～宮田線	長さ 199.8m、 幅 5.5 (9.0) m、 長さ 179.3m、 幅 5.5 (7.0) m	長さ 199.8m、 幅 5.5 (9.0) m、 長さ 179.3m、 幅 5.5 (7.0) m	97.0
⑩	町道広長～川原田線	長さ 180m、 幅 4.0 (7.5) m	長さ 180m	100
⑪	町道久保～川原田線	長さ 637.5m、 幅 4.0 (5.0) m	長さ 637.5m	100
⑫	災害公営住宅整備事業(第1期)	戸建住宅 10戸 集合住宅 38戸	戸建住宅 10戸 集合住宅 38戸	100
⑬	災害公営住宅整備事業(第2期)	敷地造成工事 戸建住宅 8戸 集合住宅 6戸	敷地造成工事 戸建住宅 8戸 集合住宅 6戸	100.0

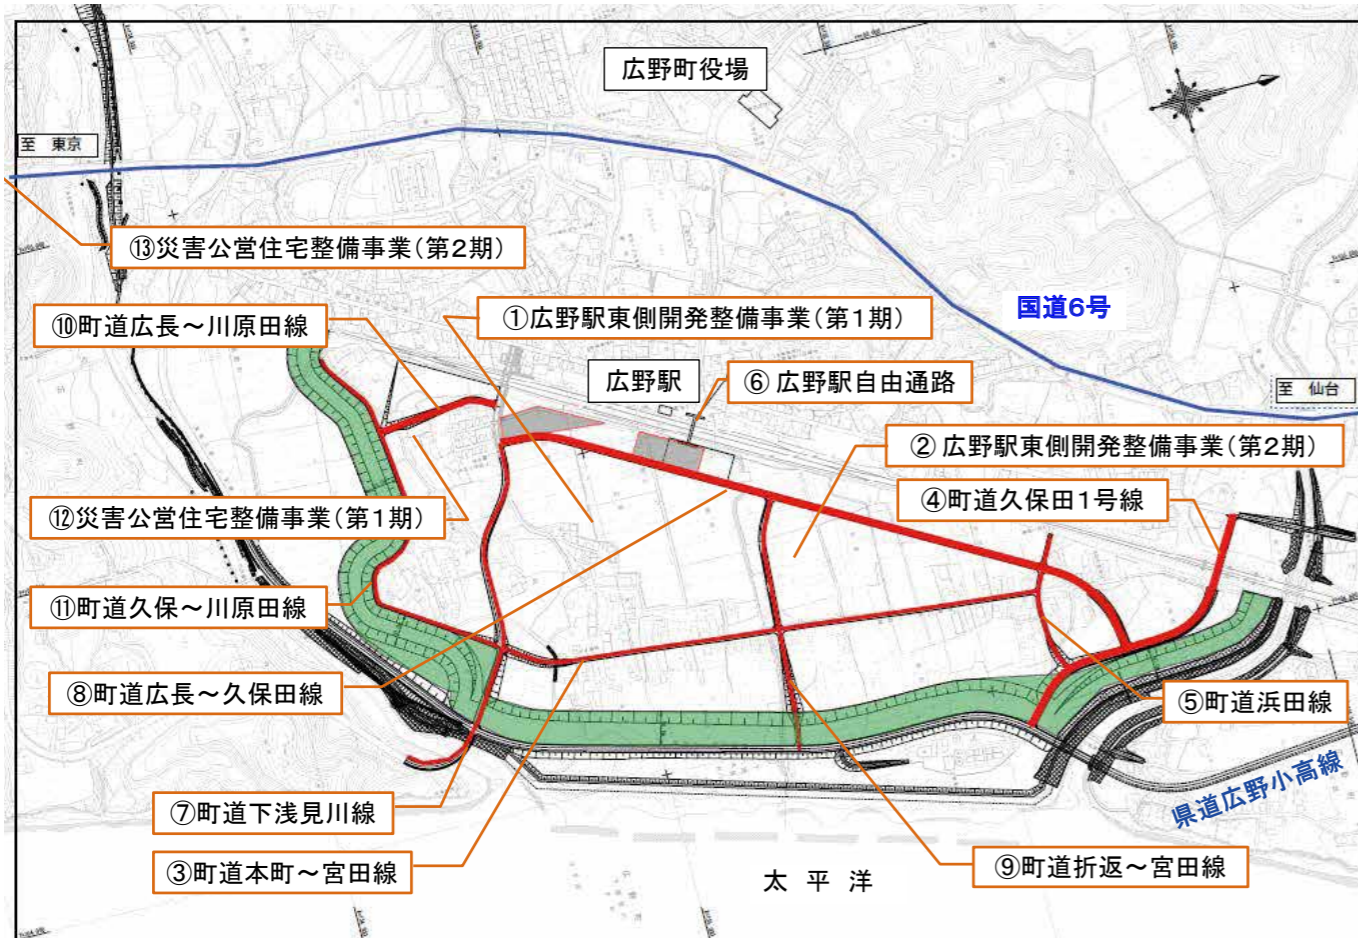

③ 本町～宮田線 (下北迫宮田地区)



町道本町～宮田線は全長850.6メートル道路で、町が進める広野駅東側開発整備事業(第1期)と同事業(第2期)を通る道路です。今年度中の完成を目指し建設が進められています。

⑥ JR広野駅自由通路 (未来のかけ橋)



JR広野駅の東西を結ぶ自由通路「未来のかけ橋」が4月1日に開通しました。改札がある西側と復興拠点として開発計画が進む東側地区が歩道橋でつながり、町民や駅利用者が自由に行き来できるようになり、緊急時には避難通路としても活用されます。

坊田橋 (浅見川河口)



坊田橋は、県道広野小高線と町内折木地区を結ぶための橋です。河川改修のため県で架け替えをしていましたが、3月30日に開通しました。

復興の状況 (みらいオフィス付近)



広野駅東側集合住宅整備事業として、町が整備した用地に地元企業や復興関連企業の就業者を対象とした就業住宅を建設しています。
