


【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ◆D-1-1-1
事業名 都市公園事業
事業費 総額 21,447 千円（国費 17,157 千円） （内訳：工事費 9,376 千円、委託料 2,268 千円、用地費 9,803 千円）
事業期間 平成 24 年度～平成 28 年度
事業目的 計画区域は沿岸部に位置し、津波による被災を受けた。東日本大震災津波の犠牲者を追悼、鎮魂するとともに、震災の経験や教訓を後世に語り継ぎ、より安全で暮らしやすい地域を創り上げていくための防災意識の向上等を「防災文化」として醸成し継承していくため、地域の防災拠点としての機能を兼ね備えたメモリアル公園等を整備することを目的とする。
事業地区 広野町大字下浅見川字本町地区
事業結果 公園整備 A=473 m ² 、水飲み場 1 基、ベンチ 4 基、サイン施設 1 基、外灯設備 1 基
事業の実績に関する評価 ① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 本施設は津波による被災を受けた地区に整備し、震災の経験や教訓を後世に語り継ぐため、記念碑の設置をしている。また、地域の方の憩いの場だけでなく、津波で亡くなられた方への追悼事業を実施している。 ② コストに関する調査・分析・評価 道路事業の残地部を活用し、本施設を整備するとともに、メモリアル公園としての機能を残した計画とした。また、指名競争入札によって業者を選定し、契約を締結しており、コストは適正なものとする。 ③ 事業手法に関する調査・分析・評価 ・計画 平成 25 年度 測量設計 平成 25 年度～平成 26 年度 用地取得 平成 27 年度 整備工事 ・実績 平成 25 年度 用地取得 平成 28 年度 測量設計、整備工事 当初は公園整備を 3 年で計画したが、本施設に接続する道路整備が深刻な人手不足により、事業期間の見直しに伴い、公園整備事業も道路整備状況に合わせて、整備スケジュールの見直しを行った。
事業担当部局 広野町復興企画課 電話番号：0240-27-1251

位置図

施工箇所

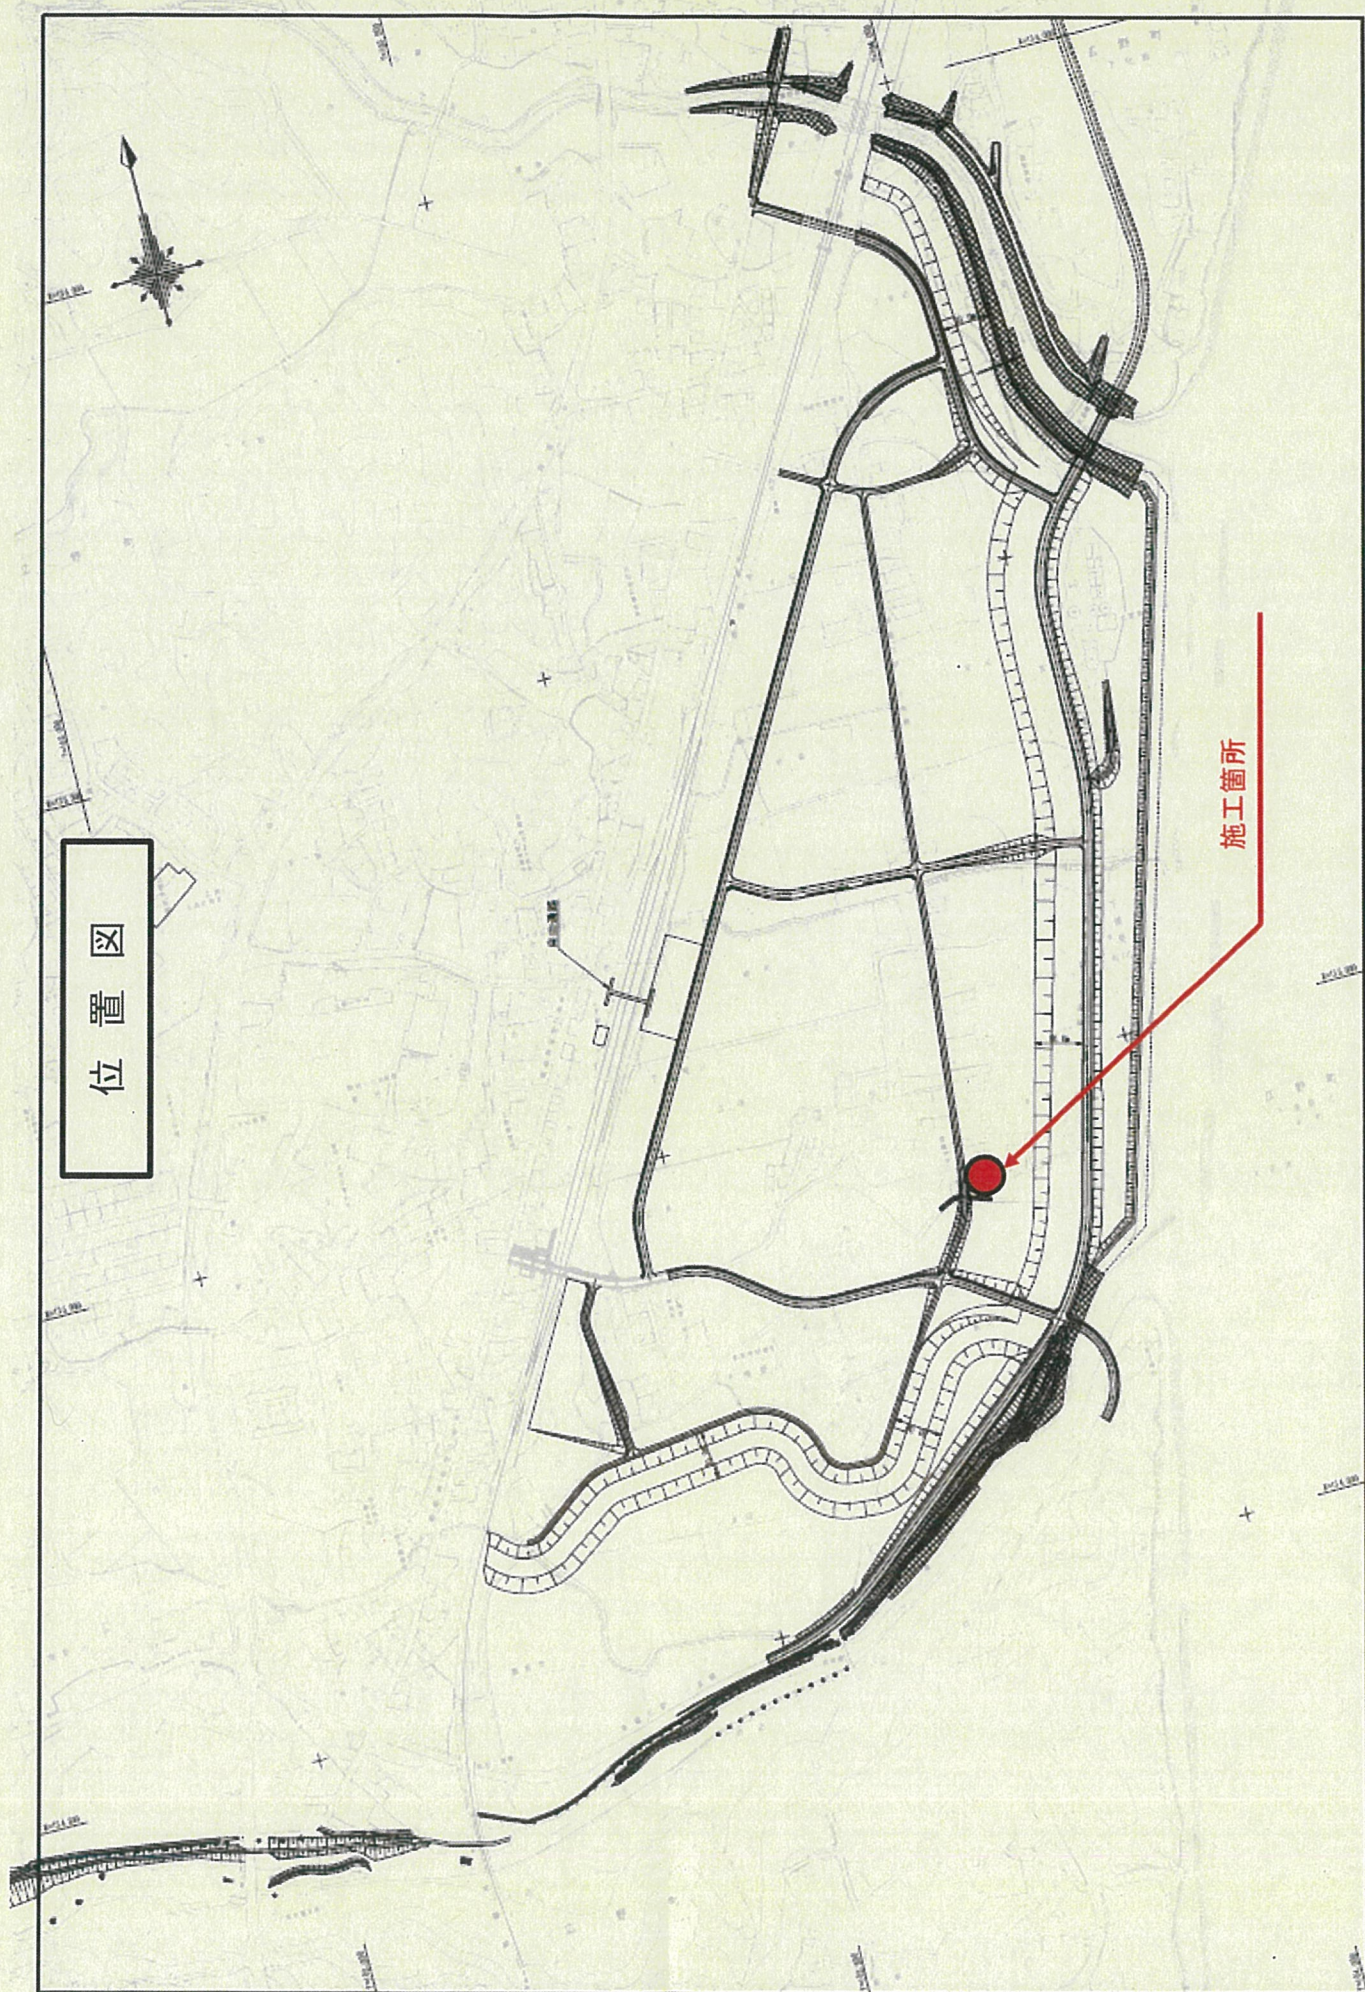

工事施工前



平成 28 年 12 月 28 日	測点 敷地西側より
工事概要	敷地整備 1.0式、 施設整備 1.0式



平成 28 年 12 月 28 日	測点 敷地西側より
工事概要	敷地整備 1.0式、 施設整備 1.0式

竣工写真



平成 29 年 3 月 31 日	測点 敷地西側より
工事概要 敷地整備 1.0式、施設整備 1.0式	



平成 29 年 3 月 31 日	測点 敷地西側より
工事概要 敷地整備 1.0式、施設整備 1.0式	
