



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ◆D-4-2-1
事業名 災害公営住宅整備事業（道路整備）
事業費 総額 2,489 千円（国費 1,990 千円） （内訳：工事費 1,593 千円、測量設計費 456 千円、用地補償費 440 千円）
事業期間 平成 26 年度～平成 28 年度
事業目的 町道と新たに整備する災害公営住宅との接道のため敷地内に道路を整備するものである。
事業地区 広野町大字折木地区
事業結果 道路新設 工事面積 A=86.05 m ²
事業の実績に関する評価 ① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 本道路が整備されたことにより、町道と災害公営住宅敷地が接道され、居住者の利便性の向上に繋がったと考えられる。 ② コストに関する調査・分析・評価 震災からの復旧・復興工事の増加に伴い、資材・労務単価が高騰する厳しい状況下にあったが、指名競争入札により適正に受注者が選定されており、当該補助限度額の範囲内で実施できたことから、事業費は妥当な規模であると考えられる。 ③ 事業手法に関する調査・分析・評価 ・計画 平成 26 年度 用地取得 平成 26 年度～平成 27 年度 測量設計 平成 27 年度～平成 28 年度 道路新設工事 ・実績 平成 26 年度 用地取得 平成 27 年度～平成 28 年度 測量設計 平成 27 年度～平成 28 年度 道路新設工事 津波被災等により全壊・流失した被災者の居住の安定を早期に確保するため、平成 28 年度内の完成を目標として事業を進め、概ね予定通り事業完了した。
事業担当部局 広野町復興企画課 電話番号：0240-27-1251

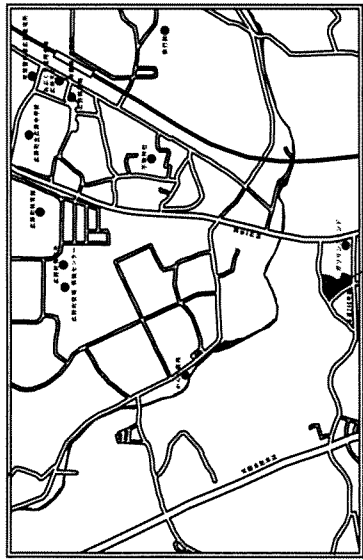

本図は、建設予定地を明示するものであり、詳細な設計図ではありません。

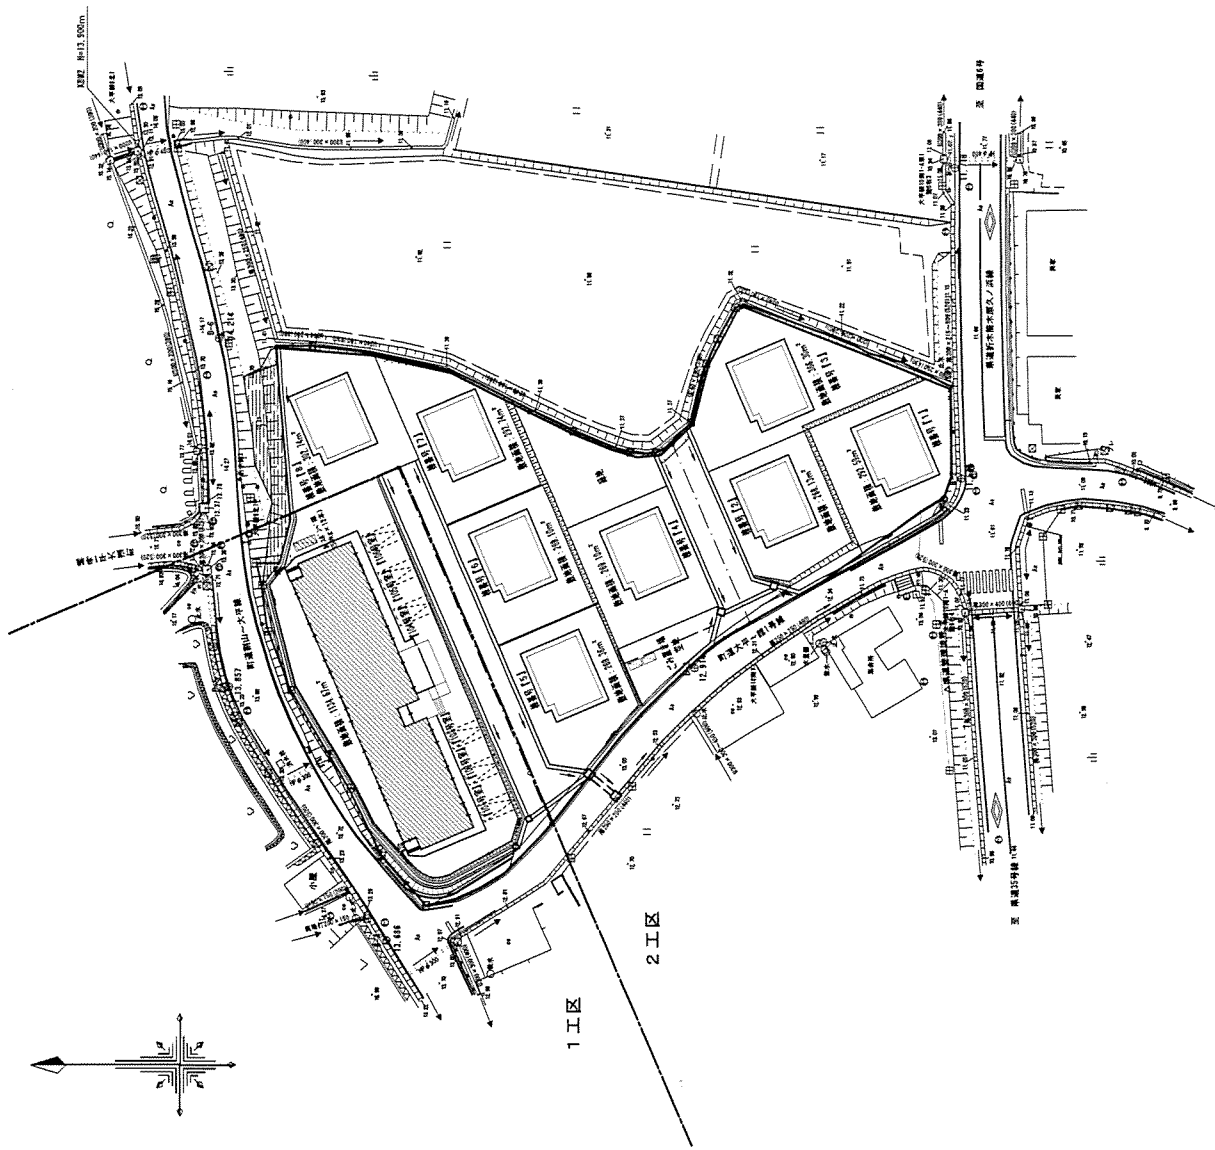

工区	棟別記号	主要用途	構造	階数	1階床面積	延べ面積	建築面積
1工区	① 共同住宅	共同住宅	木造	1	403.70	403.70	407.99
	② 店舗小売	店舗小売	鉄骨造(10F)	1	3.38	3.38	3.38
	③ 2LDK-①	戸建住宅	木造	1	62.93	62.93	64.59
2工区	④ 2LDK-②	戸建住宅	木造	1	62.93	62.93	64.59
	⑤ 2LDK-③	戸建住宅	木造	1	62.93	62.93	64.59
	⑥ 2LDK-④	戸建住宅	木造	1	62.93	62.93	64.59
	⑦ 2LDK-⑤	戸建住宅	木造	1	62.93	62.93	64.59
	⑧ 2LDK-⑥	戸建住宅	木造	1	62.93	62.93	64.59



一般財団法人
ふくしま市町村支援機構
〒960-8043 福島市中町7番17号
電話 (024) 522-5123 (代)

青野建築士 新 255098 号
一般建築士 長 島 敏 彦
平成 28 年 1 月 日

特 記 事項
設計者 新 323449 号
一般建築士 西 尾 智 則

第2期災害公営住宅建築(1工区)工事
共同住宅

案内図
全体配置図

S=1/500
S=N/S

N.P.
A-11

工事施工前



平成 28 年 1 月 27 日 測点 終点側から

工事概要 敷地造成工



平成 28 年 1 月 27 日 測点 終点側から

工事概要 敷地造成工

工事経過



町道本復旧

舗設完了



同上

余白
